

## 川井浄水場再整備事業の進捗状況について

### 1 これまでの経過概要

公表日	公表した資料等	備考
平成 19 年 12 月 14 日	川井浄水場再整備事業 実施方針	「PFI法」第5条第1項に基づく特 定事業の実施に関する方針
平成 20 年 1 月 25 日	川井浄水場再整備事業 実施方針に関する 質問回答書	公表した実施方針に関する企業からの 質問に対する回答 …… 663件
平成 20 年 3 月 3 日	川井浄水場再整備事業 特定事業の選定	「PFI法」に基づきPFI事業とし て、本事業を特定事業として実施する ことが適当であると認められたため、 PFI法第6条に基づく特定事業とし て選定
	川井浄水場再整備事業 業務要求水準書（案）	川井浄水場における再整備事業につい て、特定事業として実施する本事業の 要求する施設の性能およびサービスの 水準（案）
平成 20 年 3 月 31 日	川井浄水場再整備事業 業務要求水準書（案） に関する質問回答書	公表した業務要求水準書（案）に関す る企業からの質問に対する回答 …………… 737件

### 2 業務要求水準書（案）の質問回答状況について

- 業務要求水準書（案）等公表日 平成 20 年 3 月 3 日（月）
  - 質問受付期間 平成 20 年 3 月 4 日（火）～14 日（金）
  - 回答書公表日 平成 20 年 3 月 31 日（月）
  - 質問受付件数 企業数 28 企業、 総数 737 件
- 主な内訳 「設計業務」（第2章 細則） 279件（38%）
- ・膜ろ過装置、膜モジュールの仕様
  - ・配水池設計に関する事項 など
- 「基本事項」（第1章 総則） 101件（13%）
- ・原水水質の条件
  - ・事業終了後の設備の性能保証 など

これらの質問回答内容は、今後公表する予定の業務要求水準書等に生かしてまいります。

### 3 これからの手続き全体の流れ

#### (1) 20年度の予定

- |                  |          |
|------------------|----------|
| ①調達公告及び入札説明書等の公表 | 平成20年6月  |
| ②入札参加資格確認の受付     | 平成20年8月  |
| ③入札時必要書類の受付      | 平成20年9月  |
| ④落札者の決定          | 平成20年12月 |
| ⑤基本協定の締結         | 平成20年12月 |
| ⑥事業契約の締結         | 平成21年3月  |

#### (2) 21年度以降の予定

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ①事業の実施（設計・工事） | 平成21年4月から     |
| ②事業の実施（維持管理）  | 平成26年4月から（予定） |

実施内容	実施年度			
	19年度	20年度	21年度～45年度	
実施方針の策定・公表	←→ 12/14			
特定事業の選定 業務要求水準書(案) } 公表	3/3 →			
調達公告・入札説明書等の公表		◆		
入札参加資格確認の受付・ 入札時必要書類の受付		⇐		
落札者の決定・基本協定の締結		⇐		
事業契約の締結		⇐		
事業の実施（工事：第1段階）			⇐→ H21～25	
事業の実施（工事：第2段階）			⇐→ H26～28	
事業の実施（維持管理）			H26～45	←→

なお、入札説明書等は次の文書から構成されます。

- 入札説明書
- 業務要求水準書
- 落札者決定基準
- 提出書類作成要領及び様式集
- 基本協定書（案）
- 事業契約書（案）

# 川井浄水場再整備事業


## 新設対象施設及び管理範囲(参考)

### 参考資料

- 事業者側管理範囲  
(保安及び清掃等対象区域)
- 水道局側管理範囲  
(保安及び清掃等対象区域)
- PFI事業による新規施設

上部：新設事業者用管理棟

下部：新設配水池

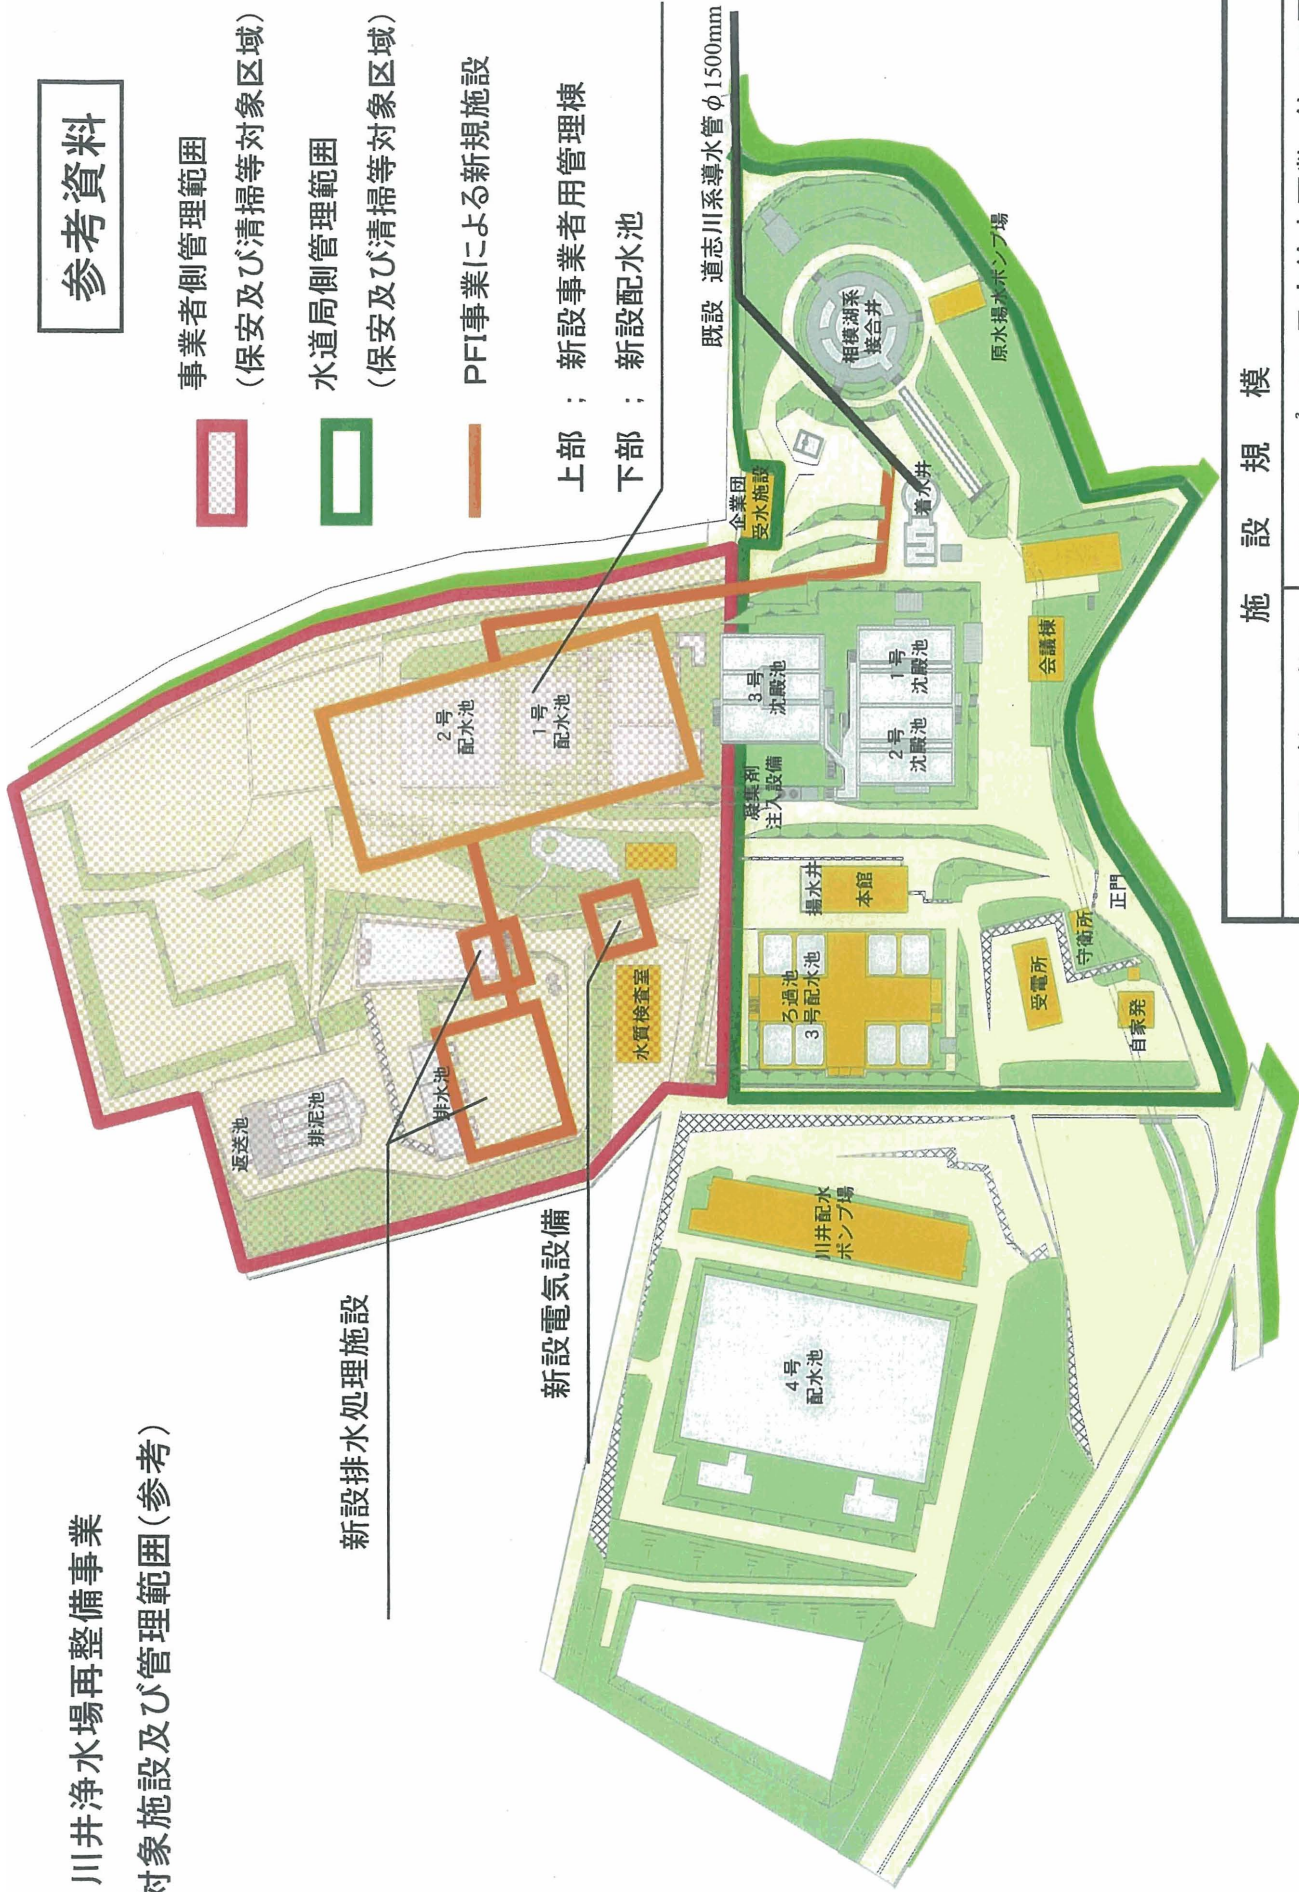

新設排水処理施設

新設電気設備

### 施設規模

取水量及び処理能力	172,800 m <sup>3</sup> /日(予定給水戸数 約28万戸)
新設配水池	有効容量: 30,000 m <sup>3</sup>
