


動物愛護センター（仮称）整備事業について

横浜市では、自然豊かな緑に恵まれた環境の中で、動物とのふれあい飼育体験や学習を通じて、犬や猫の適正飼育の啓発を図り、「人と動物が共に快適に暮らせる環境づくり」を推進する拠点として、神奈川区菅田町 75-4 に動物愛護センター（仮称）を整備しています。

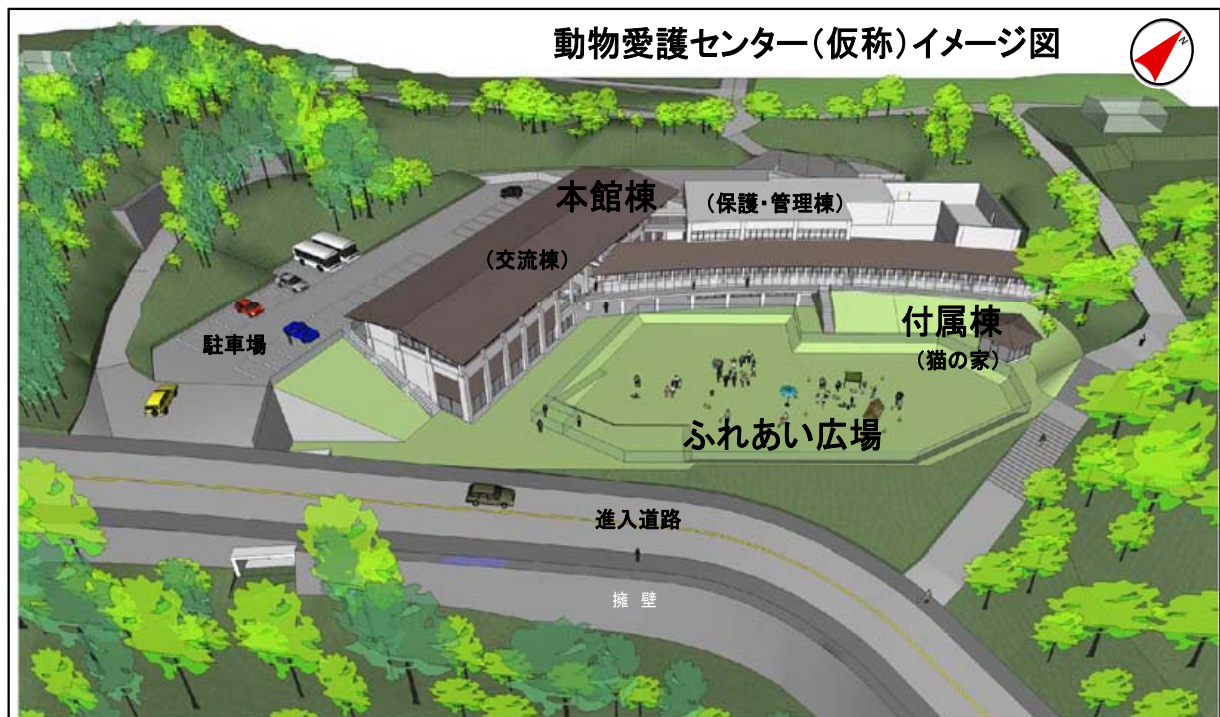

1 整備状況

動物愛護センター（仮称）整備事業は、平成19年11月から進入道路の工事に着手し、21年3月にはセンターの造成工事が完了しています。

本年度は、引き続き進入道路の工事を行い、センターの建築工事を進めていますが、年度当初に道路工事の請負業者が経営不振により施工ができなくなり、本市が5月に契約を解除しました。その後、道路工事を改めて発注する間、工事が中断となり、センターの建築工事の施工が遅れています。

2 開設時期

22年秋を予定していた動物愛護センター（仮称）の開設時期については、現在の進入道路工事や建築本体工事等の進捗状況及び最終仕上げとなる外構工事・植栽工事までの必要工期を考慮すると、23年3月しゅん工、23年5月開設となる見込みです。

3 整備スケジュール（予定）

事業区分	19年度			20年度												21年度												22年度												23年度																
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8																						
進入道路整備 〔神奈川 土木事務所〕	道路土工、擁壁等												付け替え道路整備、現道部改良等 【H21.5.26工事打切検査】												擁壁等												23年5月																			
造成・植栽 〔環境創造局〕													造成工事																								植栽工事												動物愛護センター開設							
センター建設 〔まちづくり 調整局〕													2月 市会（契約議案）												9月 本格着手												2月 請負契約変更予定												3月 センター竣工							
													建築、設備工事												外構工事																															

<参 考>

本整備事業については、本市基本計画及び中期計画の中で位置づけられ実施しています。

（本市計画）

- 平成 6年12月 「ゆめはま2010プラン基本計画・第1次5か年計画」
- 9年 5月 「ゆめはま2010プラン 第2次5か年計画」
- 14年12月 「横浜リバイバルプラン」
- 18年12月 「横浜市中期計画（横浜リバイバルプランⅡ）」

※ 動物愛護センター（仮称）整備事業につきましては、現在の畜犬センター（昭和44年開所）が老朽化していることや、猫の収容施設がないこと、犬や猫等の愛護および適正飼育の普及啓発拠点の必要性を背景に、平成6年10月に動物愛護センターの建設方針が決定しました。
